



MUNICIPIO DE
TOCHIMILCO
PUEBLA

000731



OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PRINCIPAL EN EL CENTRO DE LA
LOCALIDAD DE SANTIAGO TOCHIMIZOLCO, MUNICIPIO DE
TOCHIMILCO, PUEBLA."

Ubicación: TOCHIMILCO

Nota No. 1

No. Contrato: MTCH/FAISMUN-
24/019

CONTRATISTA: EDIFICACIONES ALTEPEXI S.A. DE C.V.

FECHA: 30/07/2024

NOTA Y CROQUIS

Obra: "Construcción de parque principal en el centro de la localidad
de Santiago tochimizolco, municipio de Tochimilco, Puebla.

Contratista: Edificaciones Altepexi S.A. de C.V.

Localidad: Tochimizolco

Fondo: FAISMUN

Ejercicio: 2024

Monto: \$ 2, 918, 630.54 (dos millones novecientos dieciocho mil
seiscientos treinta pesos 54/100 M.N.)

No. De Obra: 2024-019

No. De contrato: MTCH/FAISMUN-24/019

Inicio de obra: 30 de julio de 2024

Termino de obra: 04 de octubre de 2024



MUNICIPIO DE
TOCHIMILCO
PUEBLA



OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PRINCIPAL EN EL CENTRO DE LA
LOCALIDAD DE SANTIAGO TOCHIMIZOLCO, MUNICIPIO DE
TOCHIMILCO, PUEBLA."

Ubicación: TOCHIMILCO

Nota No. 2

No. Contrato: MTCH/FAISMUN-
24/019

CONTRATISTA: EDIFICACIONES ALTEPEXI S.A. DE C.V.

FECHA: 30/07/2024

NOTA Y CROQUIS

Apertura de bitácora

Con esta fecha se da por iniciada la obra denominada:

"Construcción de parque principal en el centro de la localidad de
Santiago tochimizolco, municipio de Tochimilco, Puebla".

La obra será ejecutada por la empresa Edificaciones Altepexi
S.A. de C.V.

Por parte del contratista se denominan al Arq. Omar Rendón Cruz
con cargo de superintendente de obra y al ing. Enrique López Pérez
como residente de obra por parte del H. Ayuntamiento, con lo cual
también están autorizados para firmar la presente bitácora
de obra.



DIRECTOR DE OBRAS
SERVICIOS PÚBLICOS
Y PROTECCIÓN CIVIL
H. AYUNTAMIENTO
TOCHIMILCO, PUE.
2021-2024

Ing. Roberto Arriaga Carvajal
Director de obras, servicios públicos
y protección civil.

Ing. Enrique López Pérez
Residente de obra.

Ing. Nestor Martínez Juárez
Representante legal



Arq. Omar Rendón Cruz
Superintendente de obra



MUNICIPIO DE
TOCHIMILCO
PUEBLA



OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PRINCIPAL EN EL CENTRO DE LA
LOCALIDAD DE SANTIAGO TOCHIMIZOLCO, MUNICIPIO DE
TOCHIMILCO, PUEBLA."

Ubicación: TOCHIMILCO

Nota No.

3

No. Contrato: MTCH/FAISMUN-
24/019

CONTRATISTA: EDIFICACIONES ALTEPEXI S.A. DE C.V.

FECHA: 30/07/2024


NOTA Y CROQUIS

En este día se dan inicio a los trabajos pertinentes a la demolición de explanada existente y de la jardinería existente. Para lo cual la cuadrilla de trabajo se coordinó con el comité de obra.

Así mismo, en los días posteriores se iniciarán los trabajos preliminares, los cuales constan de: despulme y desenraizado del terreno, limpieza, trazo y nivelación del mismo.

Ing. Enrique López Pérez
Residente de obra.

Arq. Omar Rendón Cruz
Superintendente de obra.

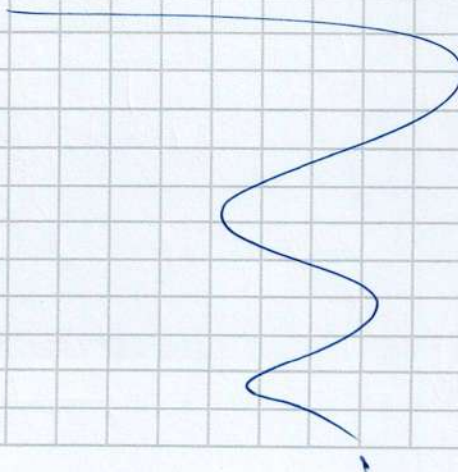



MUNICIPIO DE
TOCHIMILCO
PUEBLA



OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PRINCIPAL EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TOCHIMIZOLCO, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA."

Ubicación: TOCHIMILCO

Nota No. 4

No. Contrato: MTCH/FAISMUN-24/019

CONTRATISTA: EDIFICACIONES ALTEPEXI S.A. DE C.V.

FECHA: 05/08/2024


NOTA Y CROQUIS

En este día se informa en la presente nota de bitácora que los trabajos de demoliciones y preliminares han sido terminados.

Una vez dejado los niveles y reventones, la cuadrilla se encuentra haciendo las excavaciones correspondientes en Repas, así como el relleno con material de banco, con la compactación proctor de 85% para que comiencen con la construcción del pavimento y guarniciones.

Ing. Enrique López Pérez.
Residente de obra.

Aq. Omar Rendón Cruz
Superintendente de obra.

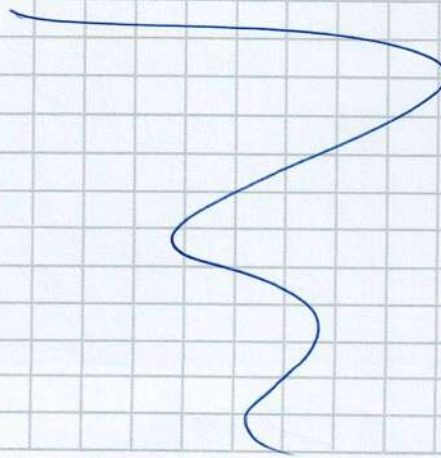



MUNICIPIO DE
TOCHIMILCO
PUEBLA

000735



OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PRINCIPAL EN EL CENTRO DE LA
LOCALIDAD DE SANTIAGO TOCHIMIZOLCO, MUNICIPIO DE
TOCHIMILCO, PUEBLA."

Ubicación: TOCHIMILCO

Nota No.

5

No. Contrato: MTCH/FAISMUN-
24/019

CONTRATISTA: EDIFICACIONES ALTEPEXI S.A. DE C.V.

FECHA: 12/08/2024

NOTA Y CROQUIS

Se anota en la presente bitácora que el día de hoy se encuentran realizando los acurres de material excavado y la cuadrilla está colando las gravimiciones que delimitan las jardinerías del parque.

Así mismo se excavó la zanja en donde se construirá la cisterna, para posteriormente habilitar el acero y suministrar las instalaciones hidráulicas.

Ing. Enrique López Pérez
Residente de obra.

Arg. Omar Rendón Cruz
Superintendente de obra.





MUNICIPIO DE
TOCHIMILCO
PUEBLA

000736



OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PRINCIPAL EN EL CENTRO DE LA
LOCALIDAD DE SANTIAGO TOCHIMIZOLCO, MUNICIPIO DE
TOCHIMILCO, PUEBLA."

Ubicación: TOCHIMILCO

Nota No.

6

No. Contrato: MTCH/FAISMUN-
24/019

CONTRATISTA: EDIFICACIONES ALTEPEXI S.A. DE C.V.

FECHA: 15/08/2024


NOTA Y CROQUIS

El día de hoy se informa en la presente nota de bitácora que una vez terminadas las guarniciones se está comenzando a construir el pavimento con adoquín en las áreas correspondientes.

Además, ya se armó el acero y la cimbra para iniciar a colar, se comienzan a recibir el material de electricidad así como el de iluminación. Para lo cual se construirá un mureta en estos días, en donde irá la bajada de luz.

Ing. Enrique López Pérez
Residente de obra.

Arq. Omar Rendón Cruz
Superintendente de obra



000737



MUNICIPIO DE TOCHIMILCO PUEBLA



OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PRINCIPAL EN EL CENTRO DE LA
LOCALIDAD DE SANTIAGO TOCHIMIZOLCO, MUNICIPIO DE
TOCHIMILCO, PUEBLA."

Ubicación: TOCHIMILCO

Nota No. 7

No. Contrato: MTCH/FAISMUN-
24/019

CONTRATISTA: EDIFICACIONES ALTEPEXI S.A. DE C.V.

FECHA: 20/08/2024


NOTA Y CROQUIS

En este día se informa que el pavimento se sigue construyendo, y la cisterna ya se colocó, así mismo se instala el asta bandera y se reciben las letras turísticas con el nombre de "TOCHIMIZOLCO".

También se informa que han llegado los postes y luminarias para ser instalados, lo cual la cuadrilla de trabajo realizará en los siguientes días.

Ing. Enrique López Pérez
Residente de obra.

Arq. Omar Rendón Cruz
Superintendente de obra.





MUNICIPIO DE
TOCHIMILCO
PUEBLA



EDIFICACIONES ALTEPEXI S.A. DE C.V.
R.F.C. EAL 150430L53

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PRINCIPAL EN EL CENTRO DE LA
LOCALIDAD DE SANTIAGO TOCHIMIZOLCO, MUNICIPIO DE
TOCHIMILCO, PUEBLA."

Ubicación: TOCHIMILCO

Nota No.

8

No. Contrato: MTCH/FAISMUN-
24/019

CONTRATISTA: EDIFICACIONES ALTEPEXI S.A. DE C.V.

FECHA: 23/08/2024

NOTA Y CROQUIS


En este día se informa en la presente nota de bitácora que el
pavimento con adoquín se ha concluido, así también la cisterna
y sus instalaciones eléctricas.

Se ha comenzado a instalar las letras turísticas.

Comenzó a llover a la 1 de la tarde, por lo cual se suspendieron
labores, para retomarlos el día de mañana.

Ing. Enrique López Pérez
Residente de obra.

Arq. Omar Rendón Cruz
Superintendente de obra.

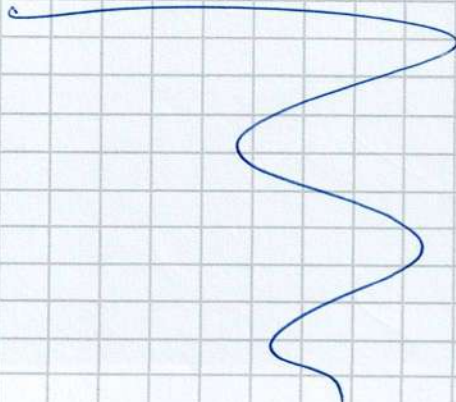



MUNICIPIO DE TOCHIMILCO PUEBLA



OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PRINCIPAL EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO TOCHIMIZOLCO, MUNICIPIO DE TOCHIMILCO, PUEBLA."

Ubicación: TOCHIMILCO

Nota No.

9

No. Contrato: MTCH/FAISMUN-24/019

CONTRATISTA: EDIFICACIONES ALTEPEXI S.A. DE C.V.

FECHA: 30/08/2024


NOTA Y CROQUIS

Para este día se informa que las letras turísticas y la iluminación con luminarias se encuentran concluidos al 100%.

En estos días la cuadrilla trabaja en la pintura de guarniciones y la limpieza general de la obra.

Iny. Enrique López Pérez
Residente de obra.

Arq. Oscar Rendón Cruz
Superintendente de obra.

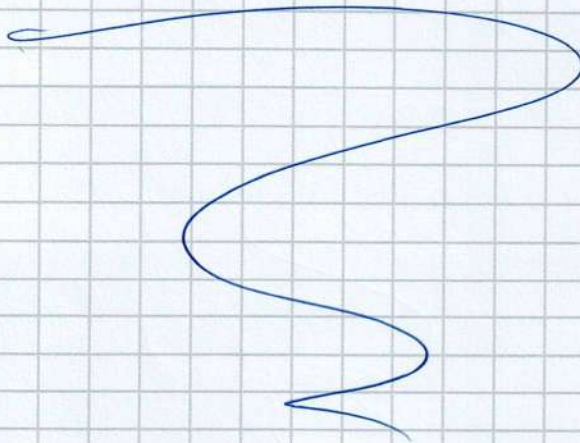



**MUNICIPIO DE
TOCHIMILCO
PUEBLA**



000740

OBRA: "CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PRINCIPAL EN EL CENTRO DE LA
LOCALIDAD DE SANTIAGO TOCHIMIZOLCO, MUNICIPIO DE
TOCHIMILCO, PUEBLA."

Ubicación: TOCHIMILCO

Nota No. 10

No. Contrato: MTCH/FAISMUN-
24/019

CONTRATISTA: EDIFICACIONES ALTEPEJI S.A. DE C.V.

FECHA: 04/09/2024

NOTA Y CROQUIS

En esta fecha se han concluido con los trabajos pertinentes
a dicha obra.

Una vez que se han recorrido e inspeccionado cada uno de los
trabajos pagados en el contrato MTCH/FAISMUN-24/019
y no habiéndose encontrado ninguna anomalía se hace el
cierre de la presente bitácora.

Ing. Roberto Arriaga Carranza
Director de obras, servicios públicos
y protección civil.



DIRECTOR DE OBRAS
SERVICIOS PÚBLICOS
Y PROTECCIÓN CIVIL
H. AYUNTAMIENTO
TOCHIMILCO, PUE.
2021-2024

Ing. Víctor Martínez García
Representante legal.



EDIFICACIONES ALTEPEJI S.A. DE C.V.
R.F.C. EAL 150430L53

Ing. Enrique López Pérez
Residente de obra.

Arg. Omar Rendón Carr
Superintendente de obra.
