


Fecha 16 / JULIO / 2024


Folio N° 052 / Anexo N°

CON ESTA FECHA SE INFORMA DE ACUERDO A LA VISITA REALIZADA POR LA SUPERVISIÓN QUE SE CONCLUYERON LOS TRABAJOS DE EXCAVACIÓN EN MATERIAL DE TERRAZERÍAS COMPACTADO A UN COSTADO DEL DREN, POR LO QUE CONTINUAN CON EL SUMINISTRO Y EJECUCIÓN DE CONCRETO TUBOS A LO LARGO DE TODO EL DREN, SE OBSERVA POR EL DÍA DE HOY ESTARÁN CONCLUYENDO ESTOS TRABAJOS, ASIMISMO SE OBSERVA QUE YA SE ESTÁN REALIZANDO LAS REPARACIONES DEL DREN, QUE ALGUNAS SE DESARROLLAN POR LAS DEMOLICIONES Y REAJUSTES OTROS YA EXISTEN, CON CONCRETO ESTRUCTURAL GRUPO, EL CUAL PERMITE QUE SE LE DE FUERZA AL DREN ASÍ COMO ESTRUCTURA AL MISMO.

POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

POR EL CONTRATISTA:


 ING. IVÁN AGUILAR HERNÁNDEZ SOLÓRZANO
 RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN
 GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES


 ARA. ADAEL SALGADO MÉNDEZ
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
 CLASSA HERENCIA, S.A. DE C.V.


Fecha 17 / JULIO / 2024


No 053

CON ESTA FECHA SE INFORMA POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" QUE SE PRESENTA LUBIA EN EL CUAL HAN SIDO INTERRUMPIDOS LOS TRABAJOS, DERIVADO A ESTAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS, MOTIVO POR EL CUAL EL DÍA DE HOY EL AVANCE DE EJECUCIÓN DE TRABAJOS SE VERA AFECTADO. SE INFORMA QUE SE HAN COLOCADO PLÁSTICOS EN TODA LA LOTA DE ATLETISMO ASÍ COMO TAMBIÉN PARA PROTECCIÓN DE LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN QUE SE ESTÁN REALIZANDO EN EL DREN EXISTENTE

POR EL CONTRATISTA:

POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS


 ARA. ADAEL SALGADO MÉNDEZ
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN,
 CLASSA HERENCIA, S.A. DE C.V.


 ING. IVÁN AGUILAR HERNÁNDEZ SOLÓRZANO
 RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN
 GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES.

Elaborado por:

Recibido por:

24

Fecha 19 / JULIO / 2024

Folio N° 054 / Anexo N°

CON ESTA FECHA SE INFORMA DE ACUERDO A LA VISITA REALIZADA POR LA SUPERVISIÓN QUE SE CONTINUARÁN CON EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO FLUIDO A LO LARGO DE TODO EL DREN, SE OBSERVA QUE EL DÍA DE HOY SE ESTARÁ REALIZANDO EL ÚLTIMO TRAMO QUE SE REQUIERE PROTECCIÓN DEL DREN, ADICIONALMENTE SE OBSERVA QUE SE CONTINUARÁN REALIZANDO LAS REPARACIONES DEL DREN CON CONCRETO ESTRUCTURAL GROUT, SE OBSERVA QUE ÚNICAMENTE FALTAN LAS REPARACIONES DE LAS TAPAS DE LOS REGISTROS QUE VAN COLOCADOS SOBRE EL DREN.

POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

POR LA CONTRATISTA:

ING. IVÁN ALDAMIR HERNÁNDEZ SOLÓRZANO
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES

ABD. RAFAEL SOLANO MÉNDEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
CCASSA AGENCIA, S.A. DE C.V.

FECHA: 19/JULIO/2024

No 055

CON ESTA FECHA SE REGISTRA POR PARTE DE "EL CONTRATISTA" QUE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA CLÁUSULA NOVENA DEL CONTRATO NUMERO 2024-SOP-DOCP-R2B-LP22-OP Y CON BASE EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 55 DE LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELO, LA ENTREGA DE LA ESTIMACIÓN No 4 DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO DE 2024 AL 15 DE JULIO DE 2024, DICHA ESTIMACIÓN ES ENTREGADA A LA SUPERVISIÓN MEDIANTE OFICIO PARA SU REVISIÓN, APROBACIÓN Y POSTERIOR TRÁMITE.

POR LA CONTRATISTA:

POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS:

ABD. RAFAEL SOLANO MÉNDEZ
SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
CCASSA AGENCIA, S.A. DE C.V.

ING. IVÁN ALDAMIR HERNÁNDEZ SOLÓRZANO
RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN
GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES

Elaborado por:

Recibido por:

25


Fecha 20 / JULIO / 2024


Folio N° 056 / Anexo N°

CON ESTA FECHA SE INFORMA DE ACUERDO A LA VISITA REALIZADA POR LA SUPERVISIÓN QUE TODA VEZ QUE SE CONCLUYO CON EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO FLUIDO A LA LARGO DE TODO EL DREN, SE HAN COMENZADO LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA CAPA FINAL DE LA SUBRASANTE CON LA FINALIDAD DE OBTENER LOS NIVELES Y PENDIENTES DE PROYECTO, SE INFORMA POR PARTE DEL CONTRATISTA QUE EL DÍA LUNES SE ESTARA DANDO INICIO A LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFALTICA, SE OBSERVA QUE LA CUADRELLA DE TOPOGRAFIA SE ENCUENTRA DANDO NIVELES A LA MAQUINARIA PRIMERO QUE SE VEYERAN AL FINAL DE CADA VIBRADA CON EL MATERIAL.

POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS:

POR LA CONTRATISTA:


 ING. IVAN ALHAJAR HERNÁNDEZ SOLÓRZANO
 RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN
 GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES


 ABL. ABEL SOLANO MÉNDEZ
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
 CASSA ACCENIA, S.A. DE C.V.


Fecha: 22 JULIO / 2024


N° 057

CON ESTA FECHA SE INFORMA DE ACUERDO A LA VISITA REALIZADA POR LA SUPERVISIÓN QUE TODA VEZ QUE SE REALIZARON LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LA CAPA FINAL DE LA SUBRASANTE CON LA FINALIDAD DE OBTENER LOS NIVELES Y PENDIENTES DE PROYECTO, SE HA COMENZADO CON LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFALTICA DE 5 CM DE ESPESOR, CABE MENCIONAR QUE PREVIAMENTE SE VIENEN REALIZANDO LOS TRABAJOS ENRIIDO DE LA CAPA FINAL DE TERRAJERIA ASI COMO EL RIEGO DE LUBA COMO EMULSIÓN ASFALTICA, SE OBSERVA QUE SE TIENE PROGRAMADO EL DÍA DE HOY UN SUMINISTRO DE 70 METROS CÚBICOS DE MATERIAL DE ASFALTO.

POR LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS:

POR LA CONTRATISTA:


 ING. IVAN ALHAJAR HERNÁNDEZ SOLÓRZANO
 RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN
 GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES


 ABL. ABEL SOLANO MÉNDEZ
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
 CASSA ACCENIA, S.A. DE C.V.

Elaborado por:

Recibido por:

26

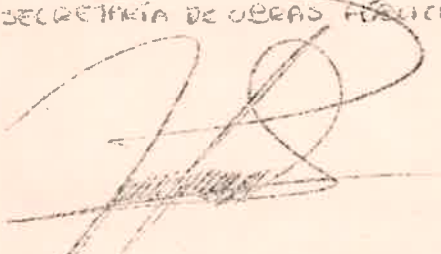
Fecha 24 / JULIO / 2024


Folio N° 058 Anexo N°

CON ESTA FECHA SE INFORMA DE ACUERDO A LA VISITA REALIZADA POR LA SUPERVISIÓN QUE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 5CM DE ESPESOR. CABE MENCIONAR QUE PREVIAMENTE SE VIENEN REALIZANDO LOS TRABAJOS DE CARRIO DE LA CAPA FINAL DE TERRACERIA ASÍ COMO EL RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA, SE OBSERVA QUE YA SE COLOCA CARPETA ASFÁLTICA TANTO EN LAS CARRETERAS NORTE Y SUR ASÍ COMO DEL LADO VENIENTE DE LA PISTA DE ATLETISMO, SE ENCUENTRAN TRABAJANDO SOBRE LA CURVA DE LA CARRETERA NORTE EN ESTOS MOMENTOS.

POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS:

POR LA CONTRATISTA:


 ING. IVAN ALONZO HERNÁNDEZ SOLÓRZANO
 RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN
 GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES


 ADM. ASael SOLANO MÉNDEZ
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN,
 CASSA GERENCIA, S.A. DE C.V.


FECHA: 25/JULIO/2024


N° 059

CON ESTA FECHA SE INFORMA POR PARTE DE LA RESIDENCIA DE SUPERVISIÓN Y FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 71 FRACCIÓN IX DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS, QUE DERIVADO DE LA REVISIÓN REALIZADA A LA ESTIMACIÓN N° 9 PRESENTADA POR LA CONTRATISTA MEDIANTE OFICIO DE FECHA 17 DE JULIO DEL PRESENTE AÑO Y REGISTRADA MEDIANTE LA NOTA DE BITÁCORA NUMERO 055 DE ESA MISMA FECHA EN LA PRESENTE BITÁCORA, SE DA SU APROBACIÓN DICHA ESTIMACIÓN POR LO TANTO SE PROCEDE CON EL POSTERIOR TRAMITE DE LA MISMA.

POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS:

POR LA CONTRATISTA:


 ING. IVAN ALONZO HERNÁNDEZ SOLÓRZANO
 RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN
 GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES


 ADM. ASael SOLANO MÉNDEZ
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN,
 CASSA GERENCIA, S.A. DE C.V.

Elaborado por:

Recibido por:

27


Fecha 26 / JULIO / 2024


Folio N° 060 / Anexo N°

CON ESTA FECHA SE INFORMA DE ACUERDO A LA VISITA REALIZADA POR LA SUPERVISIÓN QUE CONTINUARÁN CON LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 5CM DE ESPESOR, CABE MENCIONAR QUE PREVIAMENTE SE VIENE REALIZANDO LOS TRABAJOS DE BARRIDO DE LA CARA FINAL DE TERRACERÍA ASÍ COMO EL RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA, SE OBSERVA QUE EL DÍA DE HOY SE ESTARÁN CONCLUYENDO DICHS TRABAJOS, CABE MENCIONAR QUE LA TOPOGRAFÍA SE ENCUENTRA VERIFICANDO NIVELES Y PENDIENTES DE ESTOS TRABAJOS.

POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS:

POR LA CONTRATISTA:


 ING. MARÍA ALCÁZAR HERNÁNDEZ SOLÓRZANO
 RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN
 GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES


 ABEL ABEL SOLANO MÉNDEZ
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
 (CASSA EXPERIENCIA, S.A. DE C.V.)

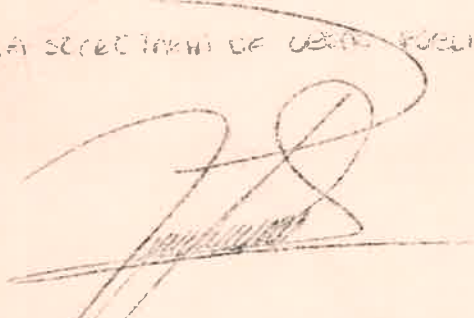
Fecha: 29 Julio/2024


No 061

CON ESTA FECHA SE INFORMA DE ACUERDO A LA VISITA REALIZADA POR LA SUPERVISIÓN QUE SE HAN CONCLUIDO LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CM DE ESPESOR A LO LARGO DE TODA LA VISTA DE ATLETISMO ASÍ COMO EN LAS CABECERAS NORTE Y SUR, CABE MENCIONAR QUE EL DÍA DE HOY SE ESTÁN RECTIFICANDO NIVELES Y PENDIENTES MARCADOS EN PROYECTO, YA QUE LA UBICACIÓN DEL MATERIAL DE TARTÁN Y PARA QUE CUMPLA LAS NORMAS DE LOS HOLS DE ATLETISMO ASÍ COMO DE PROYECTO ÚNICAMENTE SE PERMITE UN ERROR DE ± 2 M/M, POR LO QUE EL DÍA DE HOY SE ESTARÁN VERIFICANDO LOS NIVELES FINALES.

POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS:

POR LA CONTRATISTA:


 ING. MARÍA ALCÁZAR HERNÁNDEZ SOLÓRZANO
 RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN
 GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES


 ABEL ABEL SOLANO MÉNDEZ
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
 (CASSA EXPERIENCIA, S.A. DE C.V.)

Elaborado por:

Recibido por:

28

Fecha 31 / JULIO / 2024

Folio N° 062 / Anexo N°


CON ESTA FECHA SE INFORMA QUE DE ACUERDO CON EL PROCESO CONSTRUCTIVO DE LA COLOCACIÓN DEL MATERIAL DE TARTÁN, EL TIEMPO PARA LA COLOCACIÓN DEL MISMO DESPUÉS DE REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CARPETA ASFÁLTICA NUEVA, ES DE APROXIMADAMENTE 21 DÍAS, YA QUE EL ASFALTO NUEVO EMITE EVAPORACIÓN DE LOS QUÍMICOS CON LOS CUALES ESTÁ COMPUESTO, POR LO TANTO LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DE TARTÁN, NO PODRÁN REALIZARSE HASTA CUMPLIDOS LOS 21 DÍAS, RAZÓN POR LA CUAL DEBERÁ REALIZARSE UNA MODIFICACIÓN AL CONTRATO.


SE INFORMA DE LA MISMA MANERA QUE DERIVADO A LAS CONDICIONES TÉCNICAS QUE SE PRESENTARON DURANTE LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS MISIMOS QUE SE FUERON REGISTRANDO MEDIANTE LAS NOTAS 005, 007, 008, 010, 015, 019, 023 Y 027 DE FECHA 28 DE MAYO, 29 DE MAYO, 29 DE MAYO, 03 DE JUNIO, 07 DE JUNIO, 10 DE JUNIO Y 15 DE JUNIO DEL 2024 RESPECTIVAMENTE, DE LA PRESENTE BITÁCORA DE OBRA PÚBLICA, ASÍ COMO A LAS CONDICIONES CLIMATOLÓGICAS QUE SE PRESENTARON DURANTE LA EJECUCIÓN DE TRABAJOS Y QUE FUERON REGISTRADOS MEDIANTE LAS NOTAS 009, 013, 019, 021, 032, 034, 041 Y 043 DE FECHAS 29 DE MAYO, 07 DE JUNIO, 09 DE JUNIO, 11 DE JUNIO, 13 DE JUNIO, 18 DE JUNIO, 20 DE JUNIO, 24 DE JUNIO Y 02 DE JULIO DE 2024 RESPECTIVAMENTE, DE LA PRESENTE BITÁCORA DE OBRA PÚBLICA ES NECESARIO REALIZAR UNA MODIFICACIÓN AL CONTRATO TANTO EN MONTO COMO EN PLAZO.

DERIVADO DE LO ANTERIOR Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR PRIMER PÁRRAFO DEL ARTICULO 51 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA DEL ESTADO DE MORELOS. SE PROCEDE A ELABORAR EL DICTAMEN TÉCNICO QUE FUNDAMENTA Y MOTIVE LAS MODIFICACIONES DEL MONTO Y PLAZO DEL CONTRATO NÚMERO 2024-SOP-06CP-R22-OP.

POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

POR LA CONTRATISTA:


 ING. JUAN ALEJANDRO HERNÁNDEZ SOLÓRZANO
 RESIDENTE DE SUPERVISIÓN DE LA DIRECCIÓN
 GENERAL DE CAMINOS Y PUENTES


 MRS. ISRAEL SOTELO MÉNDEZ
 SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN
 (CASSA GERENIA, S.A. DE C.V.)

Elaborado por:

Recibido por:

29
